

## Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Dit rapport vervangt rapport met rapportnummer 152928

Datum keuring: 17/09/2018 Inspecteur: Michael Van den Eynde Mentor: Installateur: Ohzon BVBA

ID-label: Duplicate Niels Van opstal

B.T.W. nr.:/

IK. nr.:/

Merken en type meettoestel: Fluke 1653B Serie Nr.: 3232018

### Plaats van het onderzoek:

Straatnaam Jan Van Rijswijklaan  
Huisnummer 13 1B  
Postcode 2000  
Gemeente Antwerpen  
Type appartement

### Eigenaar:

Naam Van Gorp - Verboven Ernest - Geertje  
Straatnaam Jan Van Rijswijklaan  
Huisnummer 13  
Postcode 2000  
Gemeente Antwerpen

EAN : 54

Teller Nr.: : /

### Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens AREI artikels 271, 271bis en 86.

Netbeheerder: EANDIS Spanning: 1~230V Meter / bord verbinding: 10 mm<sup>2</sup> Max beveiliging: 63 A

Aantal borden: 1 Aantal kringen: 22 Isolatie: 2,11 M $\Omega$

Aardelektrode: RE: 18,3  $\Omega$

### DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

$\Delta I$ (mA)	$I_n$ (A)	$I_n$ - andere (A)	$I_{\Delta t}$	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	4	Ok	Ok
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	18	Ok	Ok

### BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm <sup>2</sup> )
3	C	16		2	1,5
18	C	20		2	2,5
1	C	32		2	6

Visueel nazicht (algemeen)  OK  NOK Directe aanraking  OK  NOK Indirecte aanraking  OK  NOK

Aansluitingen  OK  NOK Correcte schema's  OK  NOK schema in bijlage door Aceg vzw

Equipotentiale verbindingen  OK  NOK  niet van toepassing  in afwachting

Continuïteit  OK  NOK Verlichting / toestellen  OK  NOK  NVT

### OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

O1 Dit verslag vervangt verslag met documentnummer 152928 verslag Niels Van Opstal.

O5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst. De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

O10 Tellerlokaal niet toegankelijk op ogenblik van de keuring.

### BESLUIT

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 17/9/2043
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum: 17/9/2019
- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 4



**VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG**

De inspecteur Michael Van den Eynde

*Van den Eynde  
Van den Eynde Michael*

**Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI**

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

**Kwaliteit**

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


www.aceg.be


02 / 880.88.90

BE06 7340 3288 4322 - BTW BE0839 866 481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Indien u belangrijke uitbreidingen doet aan uw installatie, laat opnieuw keuren	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 17/9/2043	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



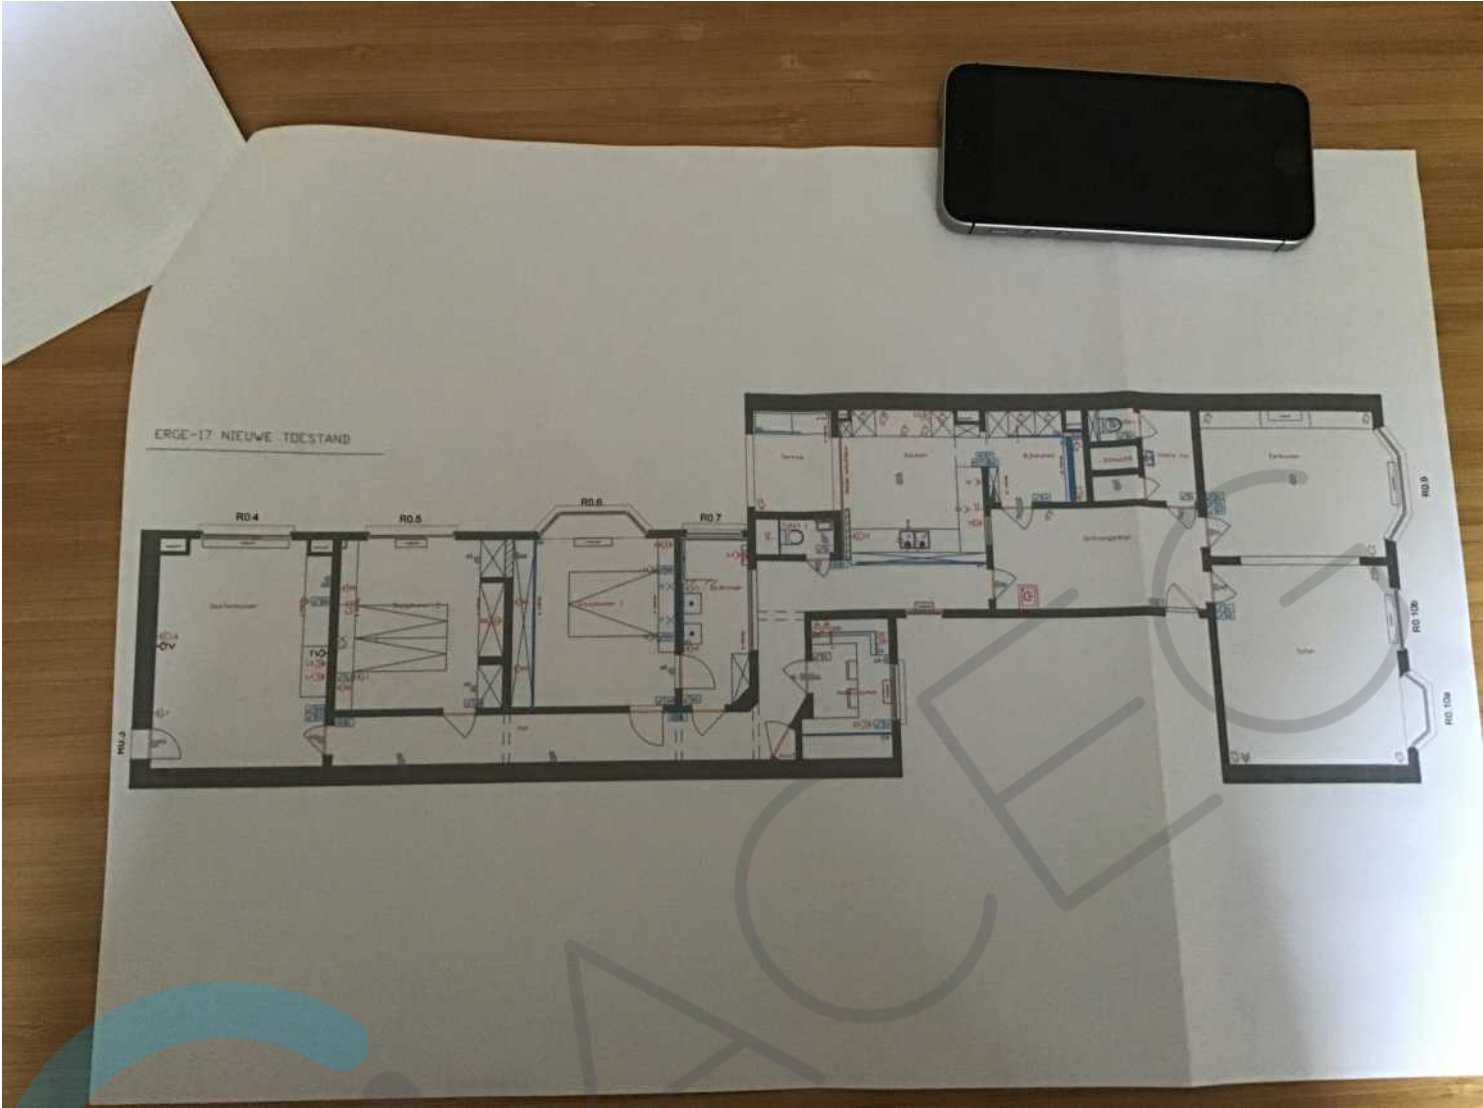

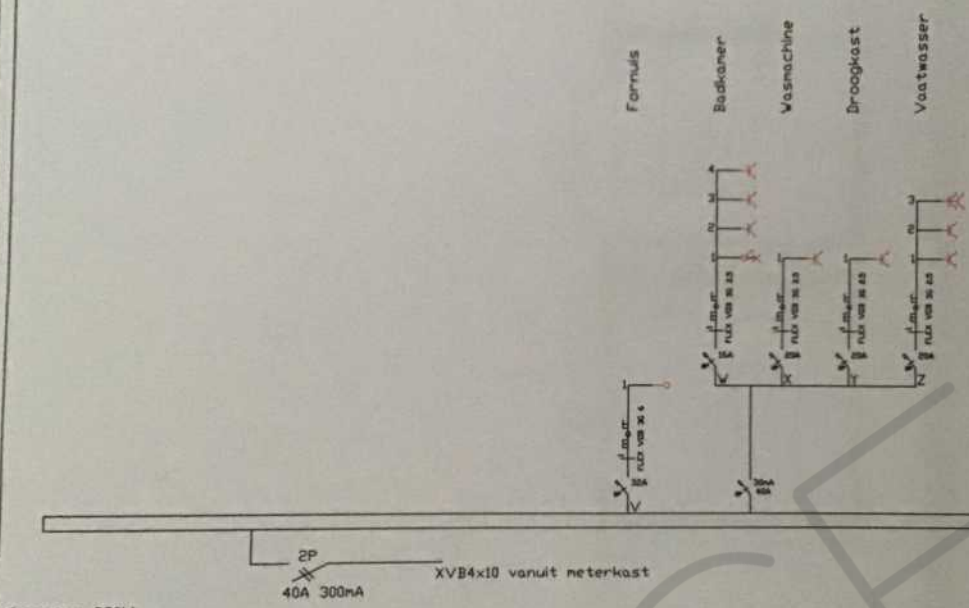

Spanning: 230V

Projekt : Van Gorp, Jan Van Rijswijcklaan 13, 2018 Antwerpen

Rev.	Datum	Wijzigingen
REV.	DATUM	WIJZIGING
REV.	DATUM	WIJZIGING
REV.	DATUM	WIJZIGING
REV.	DATUM	WIJZIGING
REV.	DATUM	WIJZIGING

CONTROLE

Datum 25/02/2018 Nr. 2/2

Plan nr. PLANNUMMER

Getekend Dekkers Kurt


Verdeelbord

Dekkers Elektrische werken

Beulken 6  
2321 Meer

kurt@dekkers.be  
Tel: 0479/914627  
B.T.W. 0632.334.363



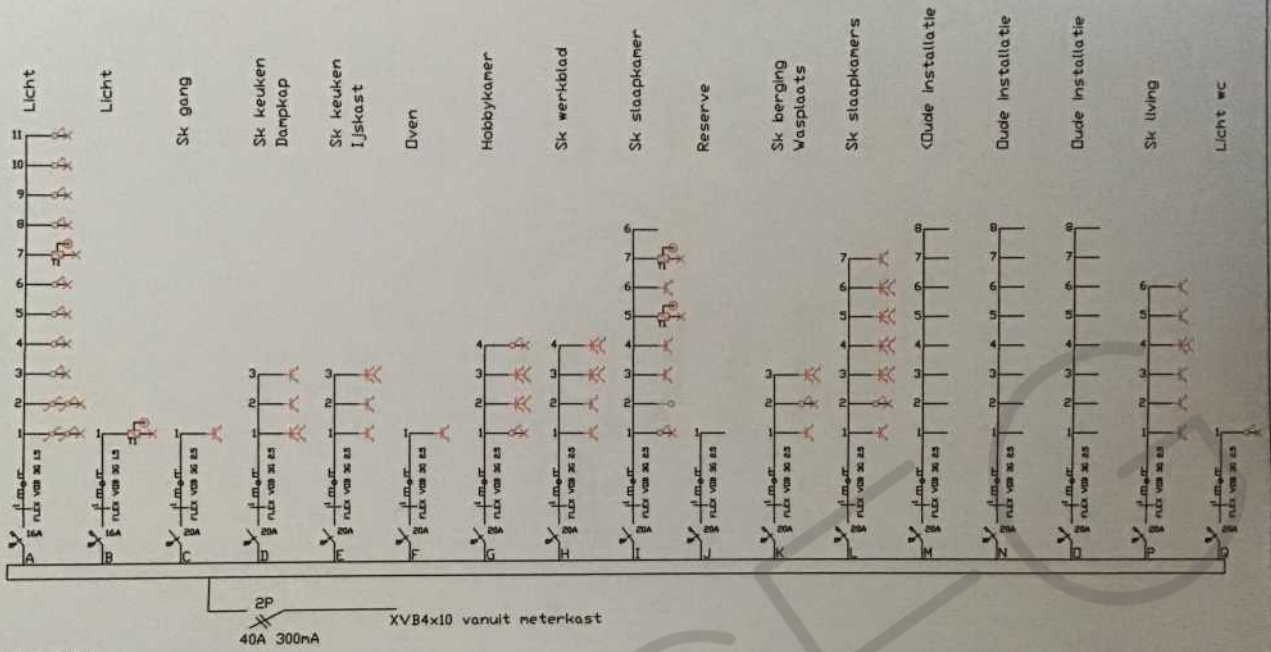

Spanning: 230V

Projekt : Van Gorp, Jan Van Rijswijcklaan 13, 2018 Antwerpen

Rev.	Datum	Wijzigingen
REV.	DATUM	WIJZIGING
REV.	DATUM	WIJZIGING
REV.	DATUM	WIJZIGING
REV.	DATUM	WIJZIGING
REV.	DATUM	WIJZIGING

CONTROLE

Datum	Nr.
25/02/2018	1/2
Plan nr.	
PLANNUMMER	
Gekend	
Dekkers Kurt	

Verdeelbord

Dekkers Elektrische werken

Beuken 6  
2321 Meer

kurt@dekke.be  
Tel: 0479/91.46.27  
B.T.W. 0832.234.363

